Bauzeitenplan 02/ Ortstermin vom 22.01.03 mit Stadtentw.

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2				
3	**Kolonne 1**	1 Tag	Di 14.01.03	Di 14.01.03
4	BE lt Telefonat vom 9.1.03	4 Tage	Di 14.01.03	Fr 17.01.03
5	Termine lt Ortsbegehung 22.1.03	1 Tag	Mi 22.01.03	Mi 22.01.03
6	Aufbau der Vekehrsanlage	1 Tag	Mi 29.01.03	Mi 29.01.03
7	Aushub Schacht RW-Straße	2 Tage	Do 30.01.03	Fr 31.01.03
8	Änderung RW Schacht	3 Tage	Mo 03.02.03	Mi 05.02.03
9	Schließen der Straße	2 Tage	Do 06.02.03	Fr 07.02.03
10	Umbau der Vekehrsanlage	1 Tag	Mo 10.02.03	Mo 10.02.03
11	Aushub Schacht SW Straße	2 Tage	Di 11.02.03	Mi 12.02.03
12	Änderung Schacht SW	3 Tage	Do 13.02.03	Mo 17.02.03
13	Aushub Haltung RW1	4 Tage	Di 11.02.03	Fr 14.02.03
14	Schließen der Straße	2 Tage	Di 18.02.03	Mi 19.02.03
15	Aushub Haltung bis SW1	5 Tage	Mo 17.02.03	Fr 21.02.03
16	Herstellen Schacht RW 1	2 Tage	Mo 17.02.03	Di 18.02.03
17	Herstellen Schacht SW 1	2 Tage	Mo 24.02.03	Di 25.02.03
18	Rohrverlegung bis SW 2+RW2	8 Tage	Mo 24.02.03	Mi 05.03.03
19	Herstellen Schacht SW 2+ RW 2	4 Tage	Do 06.03.03	Di 11.03.03
20	Rohrverlegung bis SW 3+ RW 3	7 Tage	Do 06.03.03	Fr 14.03.03
21	Herstellen Schacht SW 3+ RW 3	4 Tage	Mo 17.03.03	Do 20.03.03
22	Rohrverlegung bis SW 4+ RW 4	9 Tage	Mo 17.03.03	Do 27.03.03
23	Herstellen Schacht SW 4+ RW 4	4 Tage	Fr 28.03.03	Mi 02.04.03
24	Verfüllen bis SW 4+ RW 4	6 Tage	Fr 28.03.03	Fr 04.04.03
25	Rohrverlegung bis RW 5	4 Tage	Mo 07.04.03	Do 10.04.03
26	Herstellen Schacht SW 5+ RW 5	4 Tage	Fr 11.04.03	Mi 16.04.03
27	**Kolonne 2**	1 Tag	Mo 06.01.03	Mo 06.01.03
28	Aufbau der Verkehrsführung	1 Tag	Mo 20.01.03	Mo 20.01.03
29	Aushub Straße Schacht S07+R10	3 Tage	Di 21.01.03	Do 23.01.03
	Aushub Haltung SW-RW s. o.	11 Tage	Fr 24.01.03	Fr 07.02.03
31	Herstellen Schacht S06+R09	4 Tage	Mo 10.02.03	Do 13.02.03
32				
33	Aushub bis RW 2 + SW 2	7 Tage	Mi 19.02.03	Do 27.02.03
34	Verfüllen bis RW 2+SW 2	5 Tage	Fr 28.02.03	Do 06.03.03
35	Aushub bis RW 3+ SW 3	6 Tage	Fr 07.03.03	Fr 14.03.03
36	Verfüllen bis RW 3+ SW 3	3 Tage	Mo 17.03.03	Mi 19.03.03
37	Aushub bis SW 4+ RW 4	6 Tage	Do 20.03.03	Do 27.03.03
38	Aushub bis SW 5+ RW 5	6 Tage	Fr 28.03.03	Fr 04.04.03
39	Rohrverlegung bis SW 5	4 Tage	Mo 07.04.03	Do 10.04.03
40	Verfüllen bis SW 05+ RW 05	6 Tage	Fr 11.04.03	Fr 18.04.03
41				
42	Baustelle räumen	4 Tage	Mo 21.04.03	Do 24.04.03

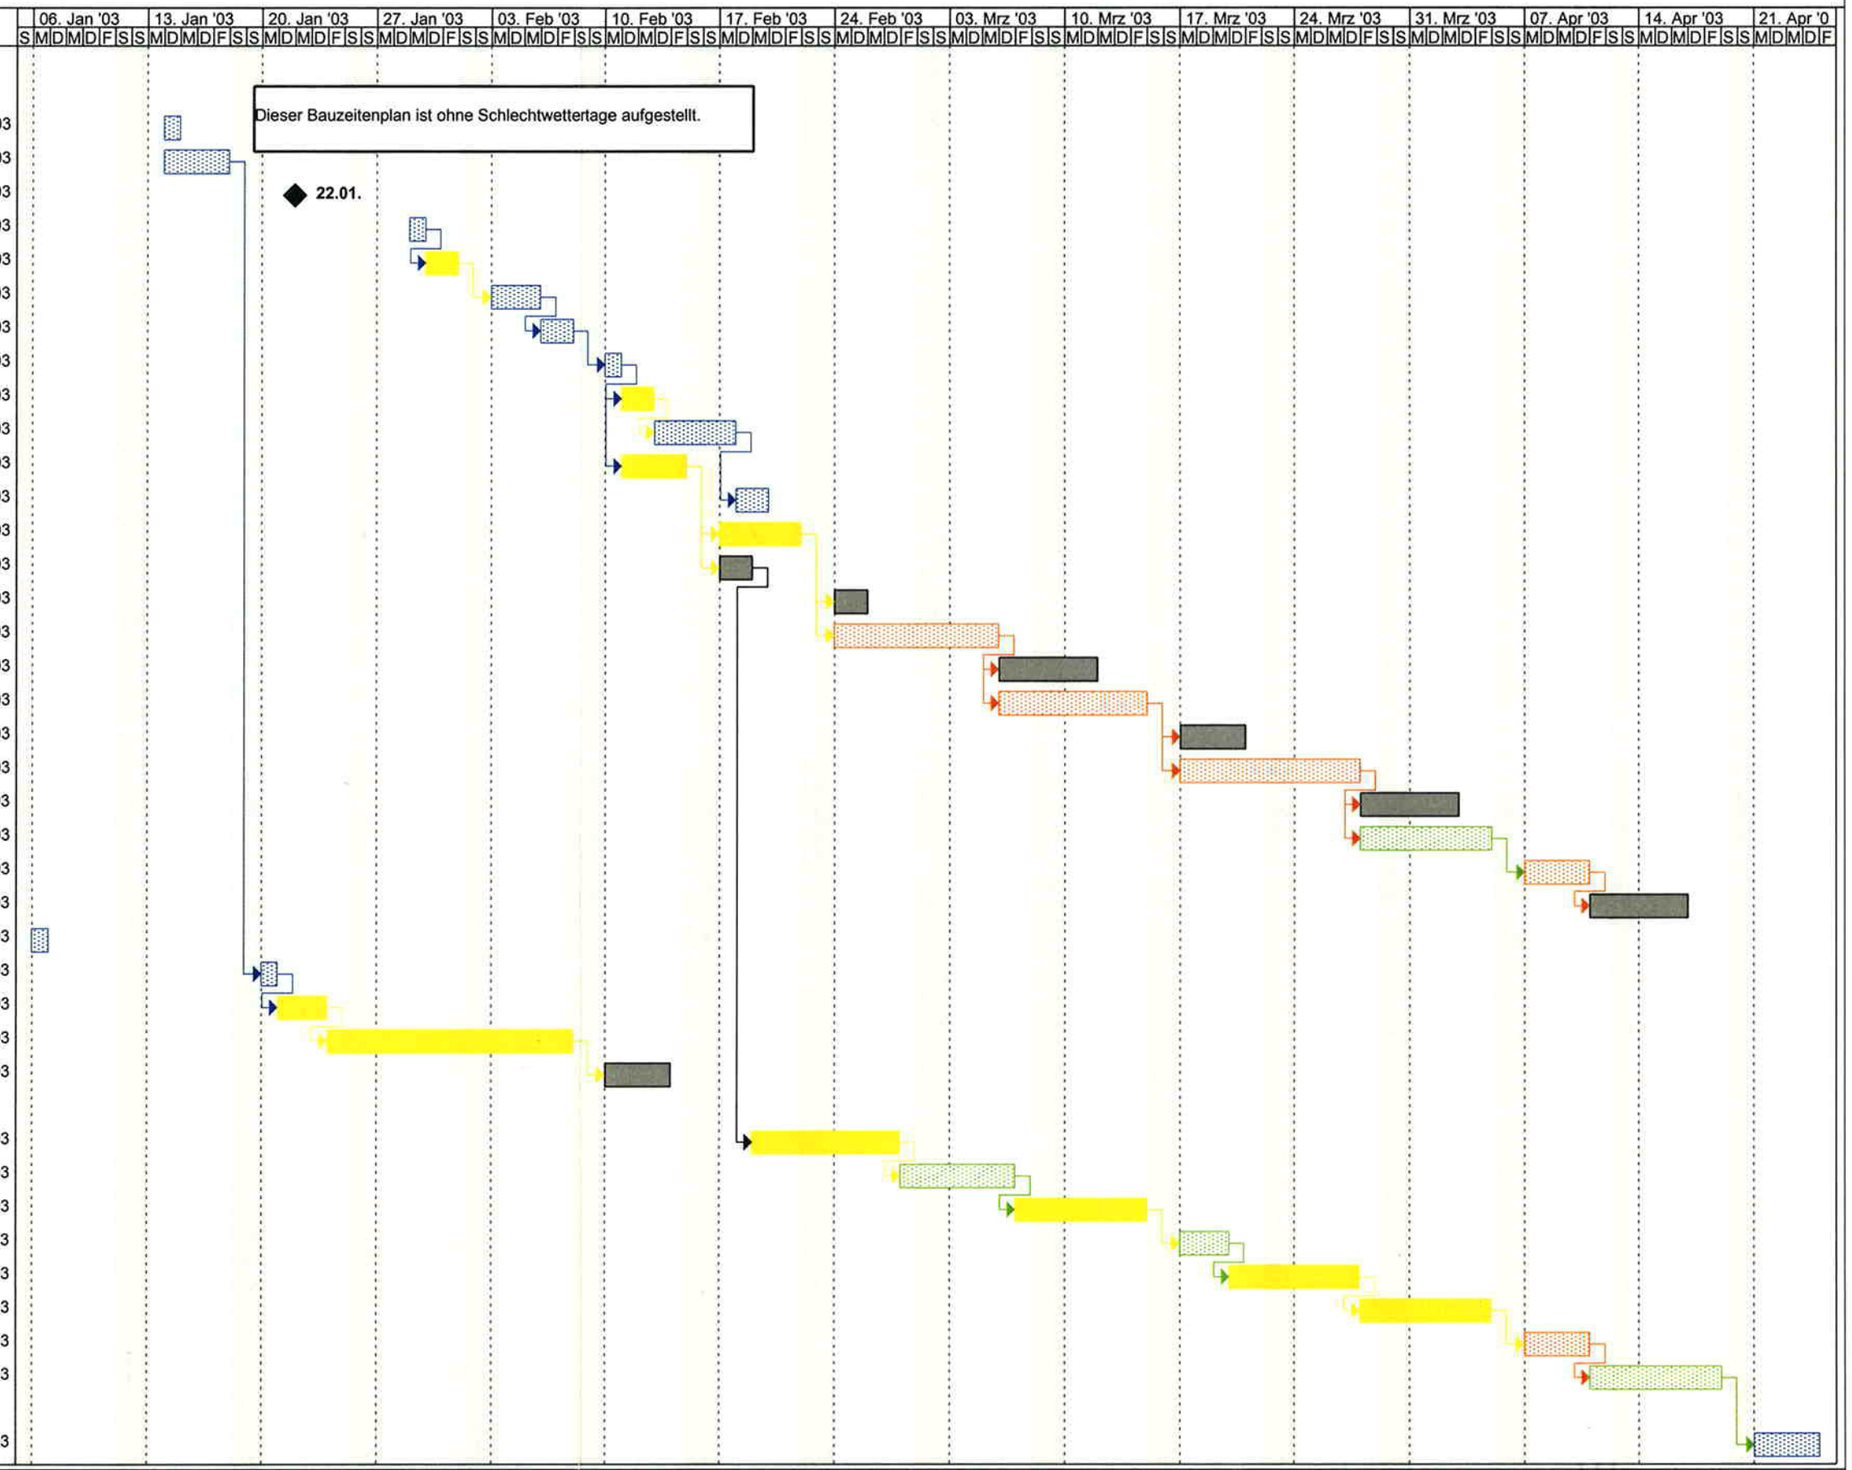

Projekt: Bauzeitenplan vom 05.12
Datum: Do 23.04.09

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Unterbrechung		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang			
In Arbeit		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externer Meilenstein			
